

# HomeTalk OnePass

## 개발 착수 가이드 & 로드맵

기획안 피드백 + 4주 스프린트 + 초기 세팅 + 개발 순서

2026.03.30 | 수업 6h + 프로젝트 2h/일

# CONTENTS

## PART 1

현재 상황 & 남은 일정

## PART 2

기획안 피드백 (7명)

## PART 3

4주 개발 로드맵

## PART 4

초기 프로젝트 세팅

## PART 5

개발 순서 (의존성 기반)

## PART 6

최종 발표 이후 계획

# PART 1 | 현재 상황 & 남은 일정

## 완료된 것

- ✓ 기획서 → 기획 발표(3/27) → 구현가이드 최종본 완성
- ✓ 7명 모듈 분담 확정
- ✓ 공통 테이블·알림·쪽지 규격 합의
- ✓ Git 브랜치 전략 합의

## 마일스톤

| 마일스톤  | 날짜      | D-Day |
|-------|---------|-------|
| 개발 착수 | 3/30(월) | D-0   |
| 중간 발표 | 4/24(목) | D+25  |
| 최종 발표 | 5/15(목) | D+46  |
| 수료일   | 6/12(목) | D+74  |

시간 배분: 수업 6시간 + 프로젝트 2시간/일 (향후 프로젝트 시간 확대 예정)

# PART 2 | 기획안 피드백 (1/2)

아래 평가는 기획 문서의 완성도를 기준으로 한 것이며, 개인의 역량 평가가 아닙니다.

| 담당          | 모듈          | 평가    | 잘한 점                          | 보완할 점                                                    |
|-------------|-------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 황순재<br>(PM) | 로그인<br>회원가입 | ★★★★☆ | ERD 5테이블 일치<br>요구사항 3단 분류     | 비밀번호 암호화 강도,<br>토큰 유효시간 등 보안 설정을<br>코드에 구체적으로 명시 필요      |
| 이지현         | 일정·공지       | ★★★★☆ | 달력 중심 UX<br>Must/Should/Could | DB 13테이블은 과도<br>MVP는 3테이블로 축소<br>설문/첨부는 확장 기능으로          |
| 원하현         | 주차          | ★★★★☆ | 우선순위 3단계<br>쿼서치(뒤4자리)         | DB 스키마를 이미지가 아닌<br>DDL 텍스트로 명시 필요<br>동시성 처리는 MVP에서 생략 가능 |
| 배지현         | 관리비         | ★★★★★ | 기능ID 체계 ★★<br>DB 근거 서술 ★★     | 엑셀 재업로드(UPSERT)<br>시나리오 보완 필요<br>알림 연동(고지/D-7) 구체화       |

# PART 2 | 기획안 피드백 (2/2)


| 담당  | 모듈                      | 평가    | 잘한 점                      | 보완할 점                                                       |
|-----|-------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 김연수 | 커뮤니티                    | ★★★★☆ | WF 상세도 최고<br>임시저장 고유 아이디어 | MVP 범위 명확화 필요<br>(카테고리+게시글+댓글+임시저장)<br>Soft Delete 연쇄 처리 설계 |
| 김지현 | 예약·민원<br>문의             | ★★☆☆☆ | 기능정의→MVP→WF<br>구조적 접근     | 기획 문서가 이미지 중심<br>→ 텍스트 기반 명세로 전환<br>민원 4단계 상태추적 설계 필요       |
| 김기남 | 대시보드·알림<br>쪽지·마이페이<br>지 | ★★☆☆☆ | 역할별 대시보드<br>분기 인식 정확      | 각 위젯이 표시할 데이터<br>구체화 필요 (어떤 API 호출?)<br>대시보드는 마지막 통합 단계     |

배지현의 기능ID 체계는 전체 프로젝트 표준으로 채택 | 김연수의 임시저장은 커뮤니티 핵심 기능으로 채택

개발 4주 후, 내가 만든 기능이 동작하는 모습을 직접 보여주세요. 코드가 진짜 실력입니다.

# PART 3 | 4주 개발 로드맵 — 7명 전원 병렬 진행

원칙: 7명 모두 Week 1부터 동시에 각자 모듈을 개발한다.  
단, 황순재(PM)의 공통 테이블이 먼저 완성되어야 나머지가 시작 가능 (의존성)

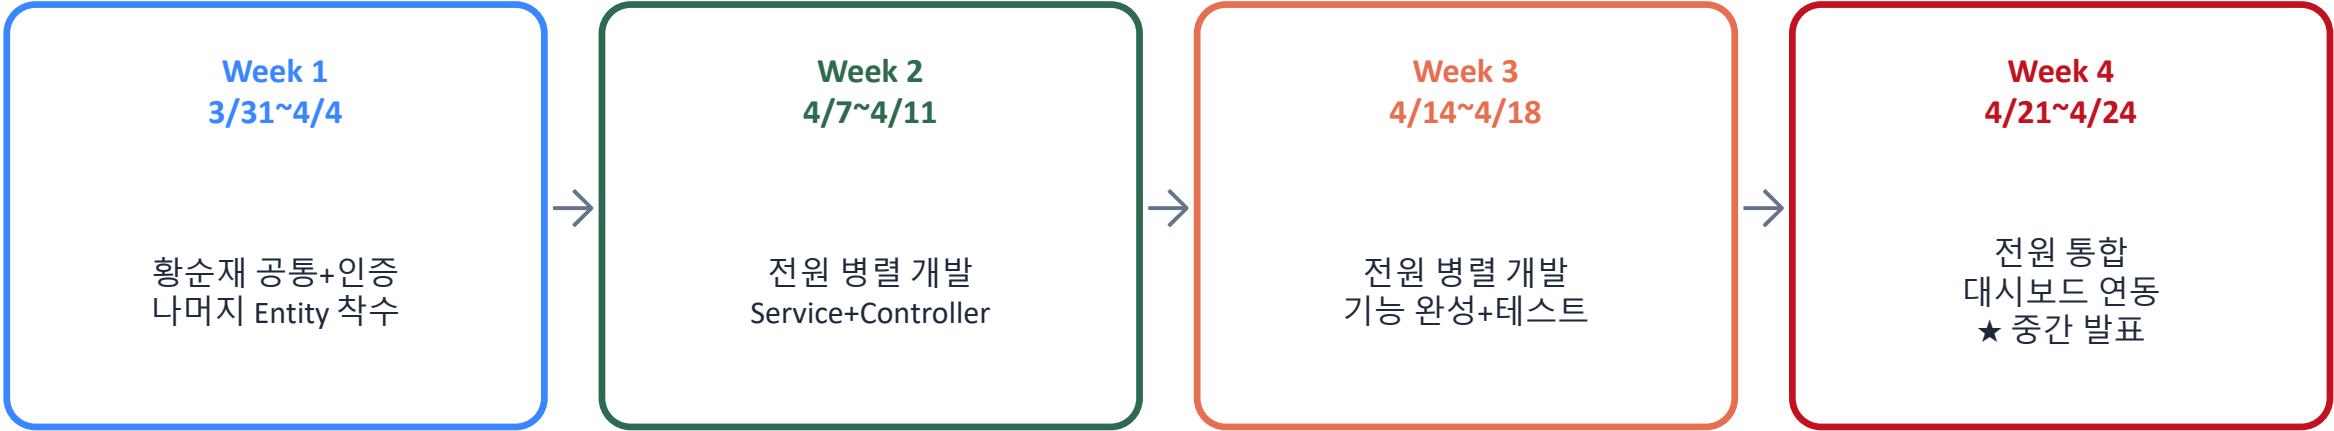

Week 5~7 (4/28~5/15)  
버그 수정 + 통합 테스트 + ★ 최종 발표

Week 8~10 (5/19~6/12)  
옵션 A: 기업형 프로젝트 | 옵션 B: React 전환

프로젝트 시간: 초기 2h/일 → 향후 확대 예정 | 수업 6h + 프로젝트 시간 병행

# 7명 전원 주별 작업 현황 — 기능 단위 풀스택 순환 개발

각 기능(CRUD)마다 Entity → Service → Controller → Template를 한 묶음으로 개발 (레이어별 x, 기능 단위 풀스택 o)

| 주차              | 황순재<br>(PM)                  | 이지현<br>공지·일정                     | 원하현<br>주차                     | 배지현<br>관리비                    | 김연수<br>커뮤니티                   | 김지현<br>예약·민원                  | 김기남<br>대시보드·알림<br>쪽지·마이페이지      |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| W1<br>3/31~4/4  | 스캐폴딩<br>공통테이블+인증<br>(풀스택 전체) | Entity 설계<br>+ 기본 목록<br>화면 구성    | Entity 설계<br>+ 기본 목록<br>화면 구성 | Entity 설계<br>+ 기본 목록<br>화면 구성 | Entity 설계<br>+ 기본 목록<br>화면 구성 | Entity 설계<br>+ 기본 목록<br>화면 구성 | Entity 설계<br>+ 기본 목록<br>화면 구성   |
| W2<br>4/7~4/11  | 코드리뷰<br>머지 지원                | 공지 CRUD<br>풀스택(BE+화면)<br>+ 달력 UI | 차량등록<br>풀스택<br>+ 방문예약 화면      | 관리비 등록<br>풀스택<br>+ 조회 화면      | 게시글 CRUD<br>풀스택<br>+ 목록/상세 화면 | 시설예약<br>풀스택<br>+ 예약 화면        | 알림 CRUD<br>풀스택<br>+ 쪽지 CRUD 풀스택 |
| W3<br>4/14~4/18 | 통합 테스트<br>+ 머지 지원            | 일정 CRUD<br>풀스택<br>+ 테스트·보완       | 입출차+쿼서치<br>풀스택<br>+ 테스트·보완    | 미납관리+납부<br>풀스택<br>+ 테스트·보완    | 댓글+임시저장<br>풀스택<br>+ 테스트·보완    | 민원추적+FAQ<br>풀스택<br>+ 테스트·보완   | 마이페이지<br>풀스택<br>+ 테스트·보완        |
| W4<br>4/21~4/24 | develop<br>머지 총괄             | UI 폴리싱<br>+ 버그 수정                | UI 폴리싱<br>+ 버그 수정             | UI 폴리싱<br>+ 버그 수정             | UI 폴리싱<br>+ 버그 수정             | UI 폴리싱<br>+ 버그 수정             | 대시보드 통합<br>+ UI 폴리싱             |

핵심: 매주 백엔드+프론트를 함께 개발. 기능 하나를 끝까지 완성한 후 다음 기능으로.

## 모듈별 완성 목표 시점

| 모듈             | 담당       | 목표 완성        | 비고                 |
|----------------|----------|--------------|--------------------|
| <b>공통 + 인증</b> | 황순재 (PM) | <b>W1 완료</b> | 나머지 전원의 전제조건       |
| 공지·일정          | 이지현      | W2~W3        | 독립 모듈, 병렬 진행       |
| 주차             | 원하현      | W2~W3        | 독립 모듈, 병렬 진행       |
| 관리비            | 배지현      | W2~W3        | 독립 모듈, 병렬 진행       |
| 커뮤니티           | 김연수      | W2~W3        | 독립 모듈, 병렬 진행       |
| 예약·민원·FAQ      | 김지현      | W2~W3        | 독립 모듈, 병렬 진행       |
| 알림·쪽지·마이페이지    | 김기남      | W2~W3        | CRUD는 독립, 대시보드는 W4 |
| <b>대시보드 통합</b> | 김기남 + 전원 | <b>W4</b>    | 모든 모듈 데이터 집계       |

PM 역할 핵심: 프로젝트를 생성하고 develop 브랜치를 만들어야 나머지가 feature 브랜치를 생성할 수 있음

# Week 1 상세 | PM 초기 작업이 핵심 (3/31~4/4)

## 황순재 (PM) — 나머지 전원의 전제조건

- ① Spring Boot 프로젝트 생성 (Initializr)
- ② GitHub 저장소 + develop 브랜치 생성
- ③ BaseEntity + Household + User Entity
- ④ 시드 데이터 (세대 3 + 회원 6)
- ⑤ Spring Security + 로그인/회원가입
- ⑥ develop에 머지 → 팀원 pull 시작

## 나머지 6명 — 동시 착수

- ① git checkout -b feature/{모듈명}
- ② 패키지 구조 생성 (controller/entity/...)
- ③ 각자 모듈 Entity 작성
- ④ Repository 인터페이스 작성
- ⑤ (PM 공통 완성 후) develop pull → 연동

황순재가 ⑥까지 완료해야 나머지가 ⑤에서 pull 받아 본격 개발 시작

## ★ 4/24 중간 발표 체크리스트

---

- ☐ 전 모듈 기본 CRUD 동작 확인
- ☐ 로그인/로그아웃 정상 동작
- ☐ 역할별 대시보드 (관리자/입주민) 표시
- ☐ 시드 데이터로 데모 시나리오 가능
- ☐ Git develop 브랜치에 전체 통합 완료
- ☐ 각 모듈별 3분 데모 + 전체 10분 Q&A

**4주 후 이 자리에서 직접 데모합니다. 내가 만든 기능이 동작하는 모습을 보여주세요.**

## PART 4 | 초기 프로젝트 세팅

### 기술 스택

- Java 21 + Spring Boot 4.0.4 + Gradle
- MySQL 8 + JPA (ddl-auto: update)
- Thymeleaf + Spring Security (세션 기반)
- context-path: /hometop | port: 8090

### 각 팀원 초기 작업

- ① git checkout -b feature/{모듈명}
- ② 패키지 구조: controller/ entity/ repository/ service/
- ③ Entity 작성 → Repository → Service → Controller → Template

### PM 초기 작업 (황순재)

- ① 프로젝트 생성 (Spring Initializr)
- ② GitHub 저장소 + develop 브랜치
- ③ 공통 테이블 Entity (BaseEntity, Household, User)
- ④ 시드 데이터 (세대 3 + 회원 6)
- ⑤ Spring Security + 로그인/회원가입

### 커밋 규칙

[모듈명] 타입: 설명  
예) [주차] feat: 차량 등록 API 구현  
예) [관리비] fix: 미납 필터 쿼리 수정

## PART 5 | 개발 순서 (의존성 기반)

1단계 공통 + 인증 (황순재)



2단계 독립 모듈 — 6명 동시 진행 가능 (users/households만 참조)

이지현  
공지·일정

원하현  
주차

배지현  
관리비

김연수  
커뮤니티

김지현  
예약·민원·FAQ

김기남  
알림·쪽지·마이페이지



3단계 대시보드 통합 (김기남 + 전원) → ★ 중간 발표

## 4/24 중간 발표 체크리스트

---

- ☐ 전 모듈 기본 CRUD 동작 확인
- ☐ 로그인/로그아웃 정상 동작
- ☐ 역할별 대시보드 (관리자/입주민) 표시
- ☐ 시드 데이터로 데모 시나리오 가능
- ☐ Git develop 브랜치에 전체 통합 완료
- ☐ 각 모듈별 3분 데모 + 전체 10분 Q&A

**4주 후 이 자리에서 직접 데모합니다. 내가 만든 기능이 동작하는 모습을 보여주세요.**

## PART 6 | 최종 발표 이후 계획 (5/15~6/12)

---

### 옵션 A: 기업형 프로젝트

- 외부 업체가 제안하는 실무형 프로젝트
- 실무 경험 + 포트폴리오 다양화
- 조건: 업체 제안 확정 필요
- 기간: 5/19~6/12 (약 4주)

### 옵션 B: React 프론트엔드 전환

- Thymeleaf → React 프론트엔드 교체
- Spring Boot = REST API 서버 전환
- 최신 기술 스택 경험
- 프론트/백 분리 아키텍처 학습

→ 두 옵션 모두 이력서에 강력한 포트폴리오로 활용 가능

# 오늘의 핵심 메시지

1

MVP에 집중 — 욕심내지 말고 핵심 기능만 완성

2

매일 커밋 — 하루 최소 1커밋, 진행상황 공유

3

검색+시도 먼저 — 30분 고민 후에도 안 되면 팀원·강사에게 공유

4

PM이 허브 — 충돌 해결, 머지 관리, 일정 체크

5

4/24가 진짜 데드라인 — 동작하는 데모 필수

# HomeTalk OnePass

개발 시작합니다!

아파트관리체계 주민중심 통합 생활 플랫폼

2026.03.30 | HomeTalk OnePass 팀 프로젝트
